DOTATION KICC KINSENDA KITOTWE
TERRITOIRE DE SAKANIA
SECTEUR DE BALAMBA
Mail : dotkicc03@kinsenda.com

RAPPORT ANNUEL DE LA DOT KICC DECEMBRE 2025

I. PRESENTATION DE LA DOT KICC

La DOT KICC est une structure légale de gestion de 0,3% minimum du chiffre d'affaire de l'entreprise KINSENDA COOPOR COMPANY « KICC en sigle » et d'exécution des projets de communauté impacté par des activités minières de cette dernière. Composée de trois (3) structures Organisme Spécialisé, Unité d'Exécution et Personnels d'Appoint. *Situé à KINSENDA KITOTWE sur la Nationale N°1 Quartier Twibombele, Secteur de BALAMBA, Groupement NKOMBO, Territoire de SAKANIA, Province du Haut-Katanga en République Démocratique Du Congo*.

II. OBJECTIF DE LA DOT KICC

La DOT KICC a pour objectif la gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaire et la réalisation des projets de développement durable des communautés de KINSENDA KITOTWE et des autres communautés environnant impactés.

III. ACTIVITES REALISES

A) PROJETS

1. CONSTRUCTION POSTE DE SANTE DE KAWIMBA
2. CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE
3. SITE TOURISTIQUE
4. CONSTRUCTION CENTRE DE FORMATION SOCIO-PROFESSIONNEL
5. CONTRUCTION PORCHERIE
6. CONTRUCTION POULAILLE
7. CONSTRUCTION BUREAU DE CORDINATION ET ENTREPOT DE STOCKAGE DES MATERIELS AGRO-PASTORAL
8. CONTRUCTION POUSSINIERE
9. AMENAGEMENT CIMETIERE DE KATOTO
10. CONTRUCTION POSTE DE SANTE LWINA
11. ACQUISITION DES MATERIELS SALLA POLYVALENTE
12. ACQUISITION DES MATERIELS POSTE DE SANTE KAWIMBA
13. ACQUISITION DES MATERIELS POSTE DE SANTE LWINA
14. ACHAT AMBULANCE
15. ACHAT PICK UP 4x4 LAND CRUISER

16. ACHATS DES TERRAINS
17. ETUDES DE FAISABILITE

B) ACTIONS ET RESULTATS

- Achat des terrains
- Recrutement des membres de l'UEP
- Assemblé général avec les communautés locales
- Dépôt de la première pierre
- Sessions ordinaires et extraordinaires
- Evaluation des membres de l'UEP
- Visite des Députes Provinciaux
- Visite des Journalistes d'investigation
- Visite de la commission mixte d'évaluation de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga
- Visite des Députés Nationaux
- Visite et suivi évaluation des membres l'OS
- Visite de la cour de compte
- Visite des membres du comité des Supervisions
- Visité des Autorités locales (AT, Chef de Secteur…)
- Dotation des outils de travail aux membres de la DOT

A) TABLEAU D'ANALYSE DES RESULTATS : EVALUATION DES OBJECTIFS ET DONNEES DES INDICATEURS

N°	PROJETS	ENTREPRISES	COÛT	NIVEAU D'EXECUTION DES PROJETS	LOCALISATION	OBSERVATION
01	CENTRE DE SANTE DE KAWIMBA	**ADR**		93%	KAWIMBA	
02	SALLE POLYVALENTE	**RJM**		100%	TWIBOMBELE	
03	SITE TOURISTIQUE	**BUILDING CONSTRUCTION**		90%	SITE MELEKI	
04	CENTRE DE SANTE SOCIO-PROFESSIONNEL	**SHINE UP**		72%	SITE MELEKI	
05	PORCHERIE	**BMC**		40%	SITE MELEKI	
06	POULAILLE	**MLS**		90%	SITE MELEKI	
07	BUREAUX DE CORDINATION ET STOCKAGE DES MATERIELS	**MC**		89%	SITE MELEKI	
08	POUSSINIERE	**GREEN LAND**		100%	SITE MELEKI	
09	AMENAGEMENT CIMETIERE DE KATOTO	**GRADI**		100%	KINSENDA KITOTWE	
10	POSTE DE SANTE LWINA	**POWER CINERGIE**		58%	LWINA	
11	ACQUISITION DES MATERIELS SALLA POLYVALENTE	**GROUPE RESOLUTION**		98%	TWIBOMBELE	

12	ACQUISITION DES MATERIELS POSTE DE SANTE KAWIMBA	**RJM**		100%	KAWIMBA	
13	ACQUISITION DES MATERIELS POSTE DE SANTELWINA	**EMK**		100%	LWINA	
14	ACHAT AMBULANCE	**MWALIMU LOGISTIQUE**		100%	KINSENDA	
15	ACHAT PICK UP 4x4 LAND CRUISER	**MWALIMU LOGISTIQUE**		100%	KIWENDA	
18	ACHATS DES TERRAINS	**COMMISSION MIXTE DOT KICC**		100%		
17	ETUDES DE FAISABILITE	**BMC & MC**		100%	KINSENDA KITOTWE	

IV. DONNEES GRAPHIQUES ET DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

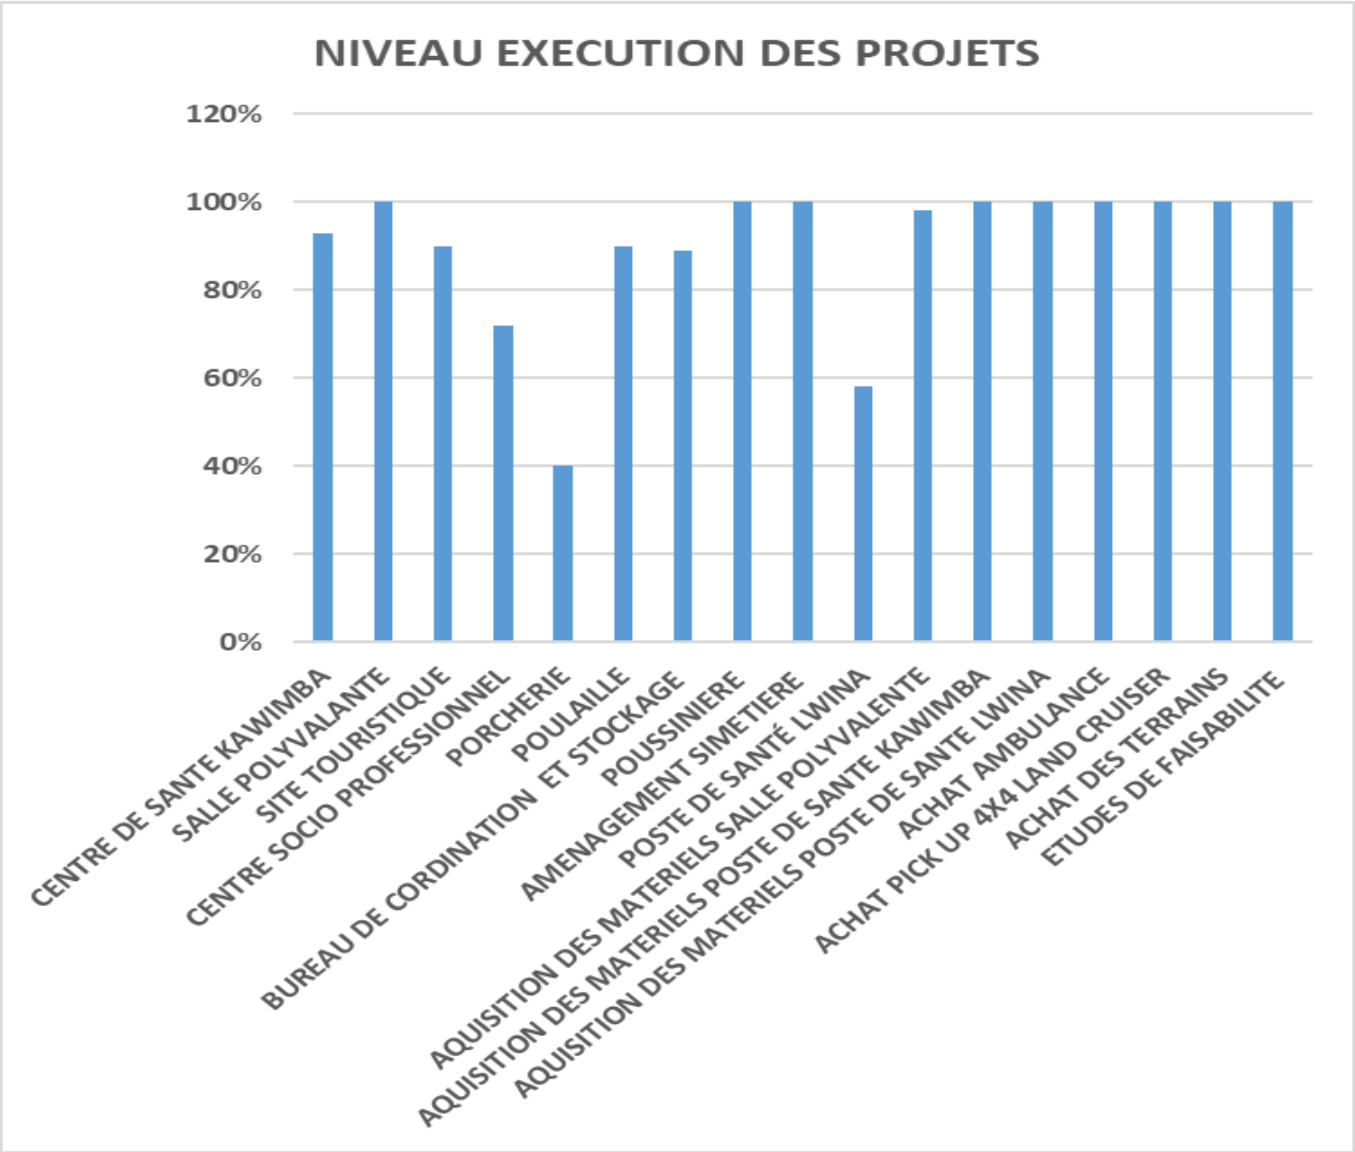

V. TABLEAU SYNTHESE BUDGET DES PROJETS DE LA DOT KICC

N°	INTITULE DU PROJET	COMMUNAUTES IMPACTEES	LOCALISATION OU EMPLACEMENT DU PROJET	DESCRIPTION DE L'INFRACTRUCTURE A REALISER	COÛT DU PROJET	CHRONOGRAMME DE LOCALISATION		
						2024	2025	2026
01	Aménagement et équipement Site Touristique	MELEKI	Cité Meleki KINSENDA KITOTWE	Aménagement extérieur du site : Construction des allés en pavé, plantation des fleurs et autres ornements, Equipement de tous les Sites en mobilier (Chambre, paillotes, piscine, air de jeu…)	81 8684$	232 894.6 $	272 894.6$	272 894.6$
02	Électrification Salle Polyvalente	TWIBOMBELE	Cité Meleki	Electrification en moyenne tension : Tirer une ligne MT avec achat câble, poteau et transformateur	277 332.5$	138 666.25$	138 666.25$	-
03	Électrification Site Touristique	MELEKI	KINSENDA KITOTWE	Electrification en moyenne tension :	123685.8$	61842.9$	6 1842.9$	-

				Tirer une ligne MT avec achat câble, poteau et transformateur				
04	Électrification Centre Socio-professionnel et Agro-pastoral	MELEKI	Cité Meleki	Electrification en moyenne tension : Tirer une ligne MT avec achat câble, poteau et transformateur	68 040.2$	-	34020.1$	3 4020.1$
05	Construction Clôture Salle Polyvalente	TWIBOMBELE	Cité Twibombele	Construction d'un enclot pour sécuriser la Salle Polyvalente	114 250$	57 260$	57 260$	-
06	Construction Clôture Site Touristique	MELEKI	Cité Meleki	Construction d'un enclot pour sécuriser le Site Touristique	16 798.35$	-	55 996.11$	5 5996.11$
07	Extension Poste de Kawimba	KAWIMBA	Kawimba	Construction d'un bâtiment secondaire abritant le bureau du Médecin, la buanderie et une salle de formation	8 5000$	425 000$	425 000$	-
08	Equipement Centre Socio-professionnel	MELEKI	Meleki	Achat des différents équipements du Centre Socio-professionnel pour les options suivantes : - Mécanique Auto	309 376$	-	-	103 125.33$

				- Ajustage - Soudure - Plomberie - Coupe et couture - Agronomie - Informatique				
09	Extension Salle Polyvalente	TWIBOMBELE	Twibombele	Construction d'un bâtiment en R1 abritant 20 Chambres, un restaurant, des toilettes intérieurs, 2 bureaux de gestion, une buanderie et un dépôt de stockage	557306$	-	-	119768.6$
TOTAL					**2975 580.42$**	**573 163.75$**	**663 179.96$**	**641 800.92$**

BUDGET ANNEXE

N°	INTITULE DU PROJET	COMMUNAUTES IMPACTEES	LOCALISATION OU EMPLACEMENT DU PROJET	DESCRIPTION BREVE DE L'INFRASTRUCTURE A REALISER	COÛT DU PROJET	CHRONOGRAMME DE REALISATION
01	Equipement et prise en charge des personnels du projet	Kinsenda Kitotwe	Kinsenda Kitotwe	Carburant, entretien des matériels roulants de la DOT, entretien et gardiennage des ouvrages de la DOT	28 000$	2025
02				Prise en charge des personnels du projet	12 000$	2025
03	Imprévu ou non alloué			Frais pour imprévu	9 085.25$	2025
TOTAL BUDGETAIRE ANNEXE					**49 085.25$**	2025
TOTAL GENERAL BUDGET FONCTIONNEMENT, PROJETS, ANNEXE AUX PROJETS					**663 730$**	2025
